Punto di misura	**P.zza Manzoni, 10**
Comune	Jesolo
Indirizzo	P.zza Manzoni, 10
Localizzazione	lastrico solare/stenditoio
Inizio Campagna	**23 luglio 2013**
Fine Campagna	**8 agosto 2013**

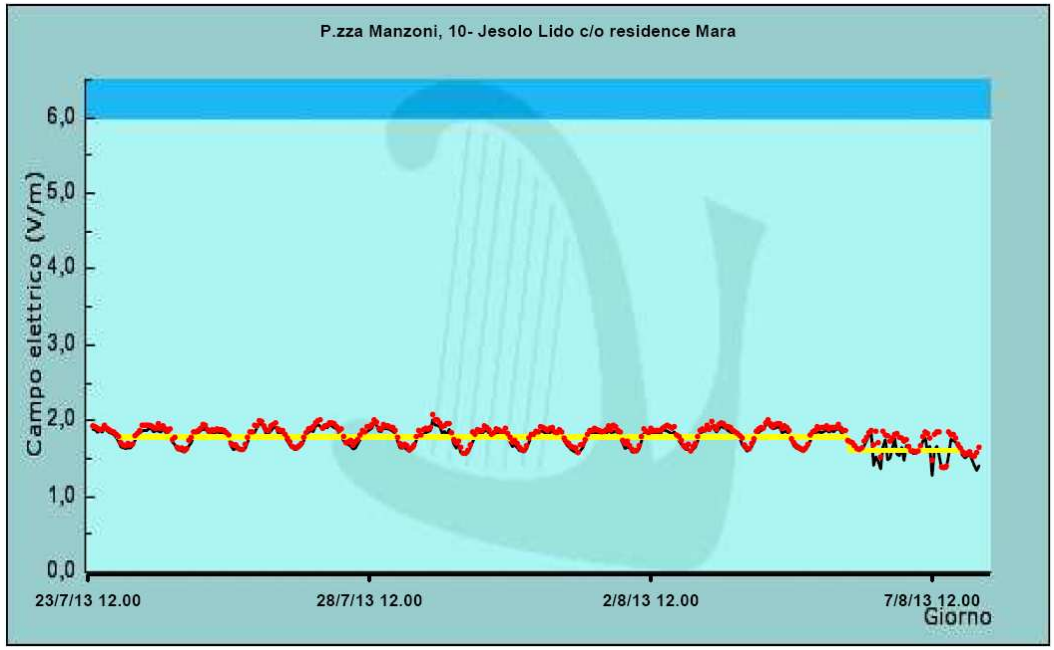

Campo Elettrico (V/m) Indicatori Complessivi della Campagna	
Valore medio della campagna	**1.8**
Valore massimo della campagna	**2.1**
Massima media giornaliera	**1.8**

Il grafico mostra, in ascissa, il periodo di rilevamento e, in ordinata, la media e il massimo orari del campo elettrico in V/m e la media di ciascun periodo di 24 (media giornaliera dalle ore 0 alle ore 24); sull'asse delle ordinate è evidenziato anche il valore di attenzione/obiettivo di qualità di 6 V/m previsto dalla normativa vigente.

	Valore medio orario
	Valore massimo orario
	Valore medio Giornaliero
	Valore attenzione/obiettivo di qualità

Allegato 1: Sintesi della campagna di monitoraggio in continuo del campo elettrico
